




**FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI**

		DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO A LA FECHA	
		CONTRATO No. : FIDUM-2022-009	IMPORTE (C/IVA): \$ 3,002,068.50		ESTIMACIÓN : 3 (TRES) FINIQUITO HOJA: 1 DE 1	PROGRAMADO:		
		OBRA: "CONSTRUCCION RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA Y ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA, AMBOS DEL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN EL RANCHO CLIFFORD DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."			PERIODO DEL:		100.00%	
		CONTRATISTA: TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES			AL		REAL:	
		FECHA DE INICIO: 2 DE NOVIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS	21 DE DICIEMBRE DE 2022		100.00%
		PRORROGA AUTORIZADA:			FECHA DE ESTIMACIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2022			
CARATULA DE ESTIMACIÓN		NINGUNA						
CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S						
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN			
1	PRELIMINARES	\$ 24,548.90	\$ 24,548.90	\$ 24,548.90	\$ -			
2	POSTES	\$ 377,458.34	\$ 377,458.34	\$ 377,458.34	\$ -			
3	CONDUCTOR	\$ 337,748.54	\$ 337,748.54	\$ 233,674.10	\$ 104,074.44			
4	ESTRUCTURAS	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	\$ -			
5	BASTIDOR	\$ 77,611.11	\$ 77,611.11	\$ 77,611.11	\$ -			
6	BANCO DE TRANSFORMACION	\$ 1,209,915.05	\$ 1,209,915.05	\$ 1,209,915.05	\$ -			
7	ALUMBRADO	\$ 390,566.52	\$ 390,566.52	\$ 390,566.52	\$ -			
8	SISTEMA DE TIERRAS Y TRAMITES	\$ 125,939.39	\$ 125,939.39	\$ 46,617.84	\$ 79,321.55			
9	SEÑALAMIENTO	\$ 3,702.24	\$ 3,702.24	\$ 3,702.24	\$ -			
SUB TOTAL=		\$ 2,587,990.09	\$ 2,587,990.09	\$ 2,404,594.10	\$ 183,395.99			
IVA=		\$ 414,078.41	\$ 414,078.41	\$ 192,367.53	\$ 29,343.36			
TOTAL=		\$ 3,002,068.50	\$ 3,002,068.50	\$ 2,596,961.63	\$ 212,739.35			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$212,739.35								
CON LETRA: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100M.N.								
EJERCICIO DEL CONTRATO (S/IVA)		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)			ANTICIPOS (S/IVA)			
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 2,495,247.81	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR :			\$ 2,404,594.10	ANTICIPO:	\$ 748,574.34	
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$ 104,074.44	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN :			\$ 183,395.99	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$ 748,574.34	
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA :			\$ 2,587,990.09	ANTERIOR:	\$ 721,378.23	
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$ 11,332.16	SALDO POR EJERCER :			\$ -	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 27,196.11	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2,587,990.09					SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -	
TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES CONTRATISTA		ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN SUPERVISOR		ING. ALFONSO SILVA SILVA JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO		21 DE DICIEMBRE DE 2022 LIC. GUILERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE DIRECTOR DEL FIDUM		



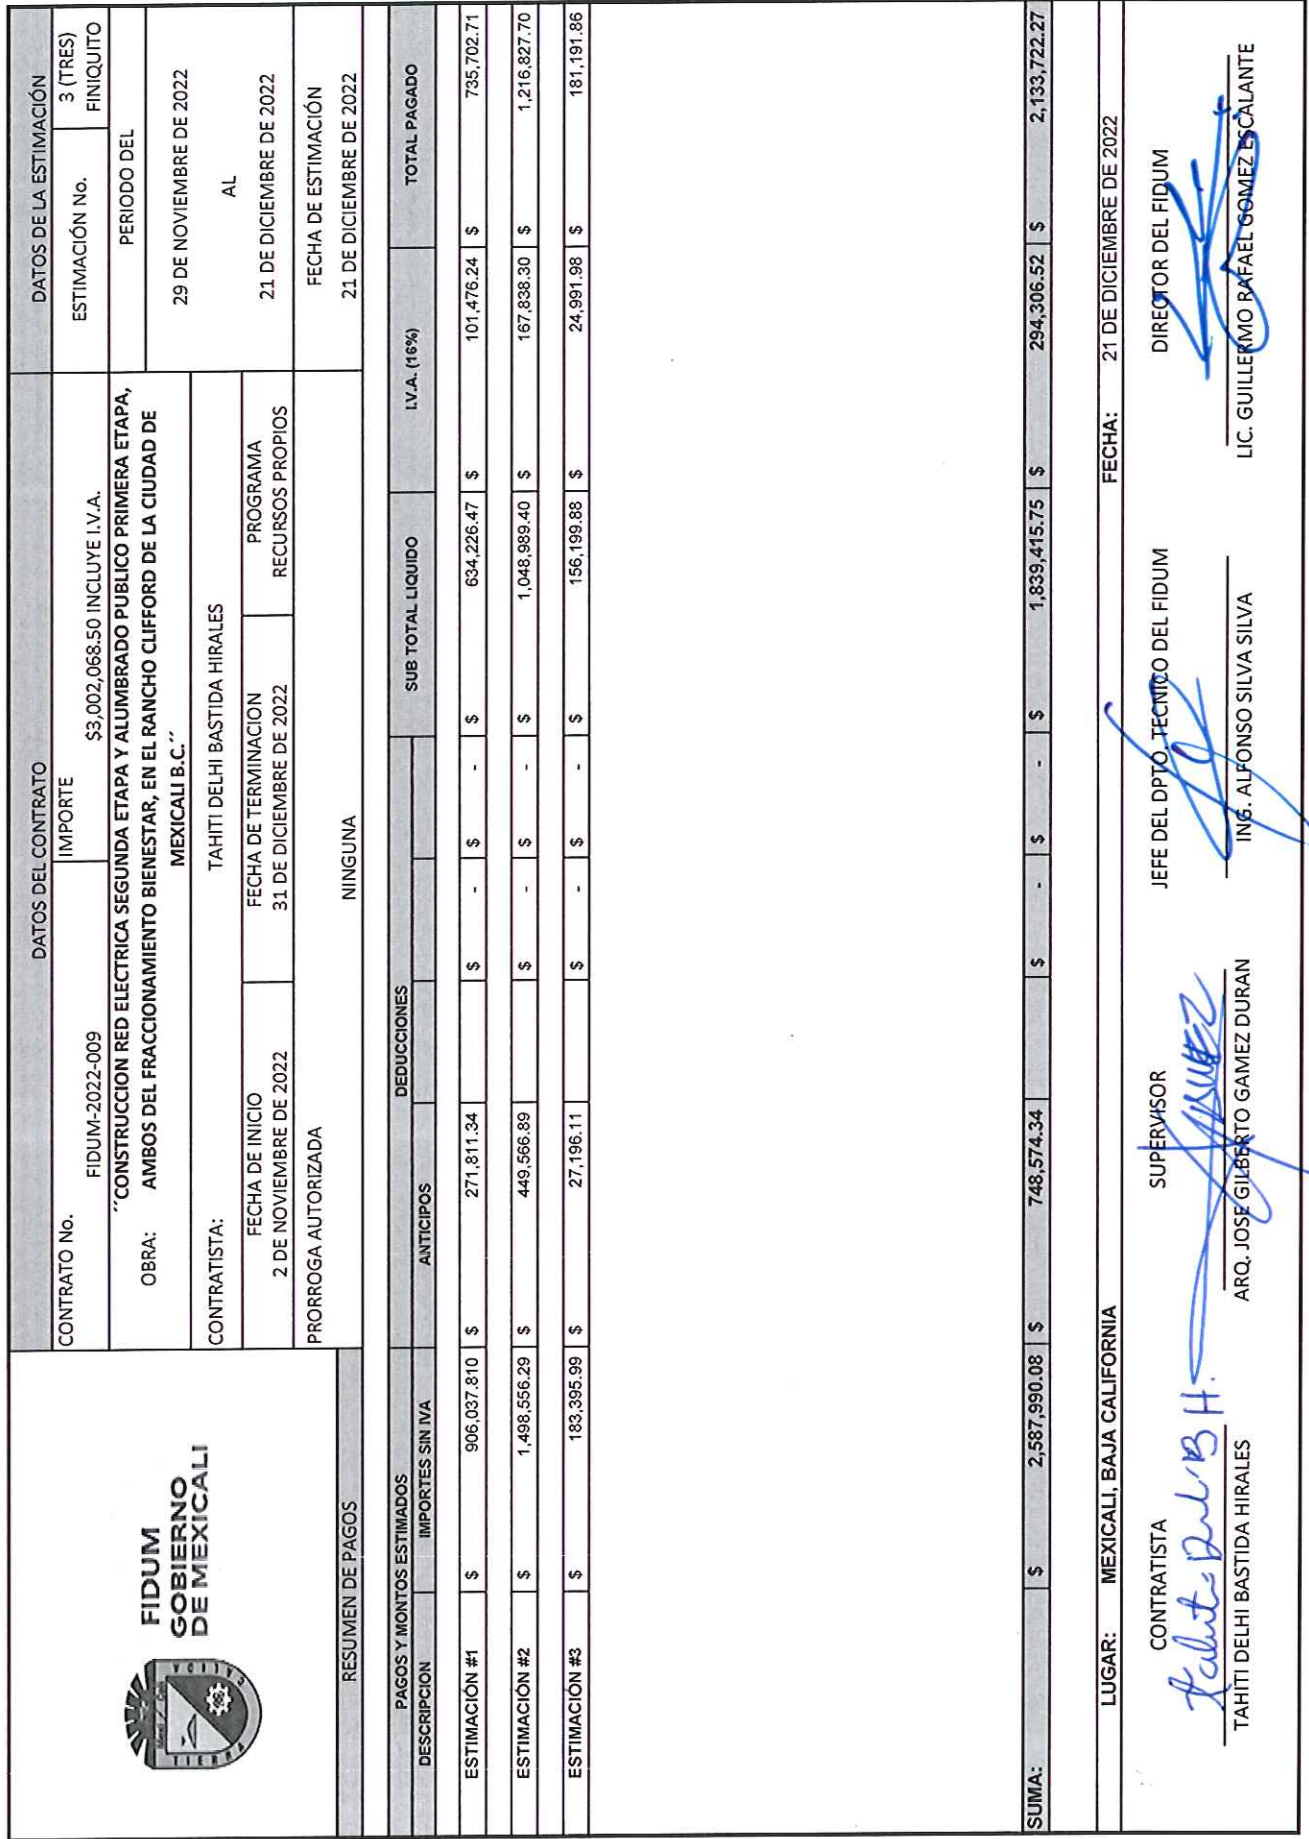

FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO										DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO		FIDUM-2022-009		IMPORTE (C/IVA):		\$3,002,068.50		ESTIMACION (TRES) FINIQUITO			
OBRA:		"CONSTRUCCION RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA Y ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA, AMBOS DEL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN EL RANCHO CLIFFORD DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."									
CONTRATISTA:		TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES									
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:				PERIODO DEL:			
2 DE NOVIEMBRE DE 2022		31 DE DICIEMBRE DE 2022		RECURSOS PROPIOS				29 DE NOVIEMBRE DE 2022			
PRORROGA AUTORIZADA:											
NINGUNA											
COSTOS											
PRECIO UNITARIO		POR ESTIMAR		HASTA ESTIM. ANTERIOR		SUB-TOTAL PRELIMINARES		IMPORTE			
				</							

Tahiti Delhi Bastida Hiraes
CONTRATISTA

ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
SUPERVISOR

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.



IC. GUILLERMO RAFAEL GÓÑEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.



FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO										DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO		FIDUM-2022-009		IMPORTE (C/IVA):		\$3,002,068.50		ESTIMACION (TRES) FINIQUITO			
OBRA:		"CONSTRUCCION RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA Y ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA, AMBOS DEL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN EL RANCHO CLIFFORD DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."		PUBLICO		PERIODO DEL:		29 DE NOVIEMBRE DE 2022			
CONTRATISTA:		TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES		PROGRAMA:		RECURSOS PROPIOS		AL			
FECHA DE INICIO:		2 DE NOVIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACION:		31 DE DICIEMBRE DE 2022		21 DE DICIEMBRE DE 2022			
PRORROGA AUTORIZADA:		NINGUNA		VOLUMENES		HASTA ESTIM ANTERIOR		PRECIO UNITARIO			
CONCEPTO		DESCRIPCION		UNIDAD		SEGUN PROYECTO		POR ESTIMAR			
CLAVE		9		SISTEMA DE TIERRAS Y TRAMITES		ESTIMA ESTIMACION		IMPORTE			
9.01		RENTA POR SEMANA (HORARIO LABORAL AL DIA) DE SENALIZACION DIURNA, PARA CANALIZACION DE FLUJO VEHICULAR SOBRE LAS VIALIDADES EXISTENTES. INCLUYE: PERSONAL PARA MANTENIMIENTO. SU INSTALACION DE ACUERDO A LA SUPERVISION DE POSTE DE PLASTICO REFLEJANTE (DELINEADOR) CON BASE PARA PAVIMENTO DE 1.05 MTS. DE ALTO. CANTIDAD MINIMA 15 PIEZAS		LOTE/DIA		18.00		0.00			
						18.00		\$ 205.68			
						SUB-TOTAL SISTEMA DE TIERRAS		\$ -			
						IMPORTE TOTAL DE ESTA ESTIMACION		\$ 183,395.99			

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION.
(CON NUMERO): \$183,395.99
(CON LETRA): CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES
CONTRATISTA

ARQ. JOSE GABRIEL GAMEZ DURAN
SUPERVISOR

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.
