



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

En la ciudad de Mexicali, B.C., a las 10:00 horas del día **09 de febrero de 2026**, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción física de los trabajos denominados:

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. DE LOS PIONEROS ENTRE CALZ. ANÁHUAC Y CALLE DEL HOSPITAL, CENTRO CÍVICO, MEXICALI, B.C."

Los cuales consistieron principalmente en preliminares, pavimentación, obra complementaria, señalamiento vial, señalamiento de protección de obra y obra extraordinaria, así mismo fueron ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública número **LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01**, por **B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 7,180,655.99
2.- Plazo de ejecución contractual	60 días naturales
3.- Fecha de inicio contractual	29 de septiembre de 2025
4.- Fecha de terminación contractual	27 de noviembre de 2025
5.- Importe del Anticipo con I.V.A.	\$ 2,154,196.80
6.- Fecha de entrega del Anticipo	06 de octubre de 2025
7.- Plazo de ejecución convenido	77 días naturales
8.- Fecha de inicio real o Convenida	07 de octubre de 2025
9.- Fecha de terminación Convenida	22 de diciembre del 2025
10.- Fecha de terminación real.	31 de enero de 2026



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

Estos trabajos consistieron en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, CUNETAS Y ESTRUCTURAS DIVERSAS.	M3	68.15
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3 KM	1,840.05
A 03	FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (VOLUMEN COMPACTO). INCLUYE PERFILADO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO EN SU PRIMER KILÓMETRO.	M3	591.20
A 04	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DEL FRESADO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	M3 KM	591.20
A 05	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA,	PZA	15.00
A 06	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA EN USO DE ALCANTARILLADO DE DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SIN INGRESO DE PERSONAL AL INTERIOR DEL POZO.	PZA	15.00
A 07	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA.	PZA	16.00
A 08	RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS, INCLUYE: CARGA, ACARREO.	PZA	31.00
A 11	PERFILADO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ZONA DE ZANJA, DE HASTA 7 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO.	M	50.00
A 12	RUPTURA DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN ZONA DE ZANJA, CON EQUIPO MECÁNICO.	M3	1.75
A 13	SONDEO DE LÍNEAS EXISTENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, GAS.	PZA	4.00
A 14	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	24.50
A 15	FORMACIÓN DE PLANTILLA 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA 3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA.	M2	17.50
A 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN NMX-E-241-CNCP-2013.	M	25.00
A 17	RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA 3/4" (GW) HASTA 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS LOCALES, ACOMODO DEL MATERIAL.	M3	8.00
A 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA INDICATIVA DE PVC DE COLOR BLANCO PARA SEÑALAR TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN LINEA DE DRENAJE PLUVIAL".	M	25.00
A 19	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, HASTA NIVEL INFERIOR DE CAPA SUBRASANTE.	M3	15.75
A 20	CARGA Y ACARREO EN SU PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	8.75
A 21	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MEDIDO EN SECCIÓN.	M3 KM	236.25



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

A 22	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PEAD DE 8"Ø A POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: PERFORACIÓN, DADO DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM2 CON ADITIVO ACELERANTE.	PZA	1.00
A 23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8'.	PZA	1.00
B PAVIMENTACIÓN			
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR.	M2	11,824.06
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTRICO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	M2	11,824.06
C OBRA COMPLEMENTARIA			
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM2, CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS, CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, CIMBRADO INTERIOR Y DESCIMBRADO.	PZA	15.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	PZA	16.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO CON 3 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS 1/4" DE DIÁMETRO @15 CM, CIMBRADO, DESCIMBRADO.	PZA	14.00
C 05	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA, INCLUYE: CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO O ASFÁLTICO CON DISCO, PERFILADO, EXCAVACIÓN, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO CON 3 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS 1/4"Ø @15 CM, CIMBRADO, DESCIMBRADO,	PZA	1.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, INCLUYE: CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y FIJACIÓN DENTRO DE OCTÁGONO.	PZA	15.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	16.00
C 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	15.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

C 10	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	7.00
C 11	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	31.00
C 12	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM ² , ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO.	M2	527.63
C 14	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=200$ KG/CM ² CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2" - 3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	PZA	1.00
D SEÑALAMIENTO VIAL			
D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	8.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	7.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	7.00
D 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-25 "PROHIBIDO EL RETORNO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-21 "ESTACIONAMIENTO PERMITIDO POR UN CORTO PERIODO, DENTRO DE UN HORARIO" DE 61x61 CM Y PLACA CON LEYENDA DE HORARIO DE 61x20 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. ELABORADA E INSTALADA DE ACUERDO A PROYECTO. KG/CM ² DE 0.30x0.30x0.60 M.	PZA	12.00
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. ELABORADA E INSTALADA DE ACUERDO A PROYECTO.	PZA	1.00
D 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-51 "PASO DE DISCAPACITADOS" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	3.00
D 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M ² .	M	1,390.90



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

D 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	M	73.95
D 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	M	1,001.40
D 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CORDONES O GUARNICIONES DE CONCRETO.	M	1,648.10
D 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO, PARA FIJAR CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.	PZA	747.00
D 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO Y/O BITUMINOSO.	PZA	280.00
E SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA			
E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA/SEM	547.86
E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	M/SEM	1,008.096
E 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	40.00
E 04	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 0.86x0.86 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	40.00
E 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	199.99
E 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, CON PANEL DE FLECHEO DE 120 CM DE ANCHO MÍNIMO Y 215 CM DE ALTO MÍNIMO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	JORNADA	40.00
EXTRA OBRA EXTRAORDINARIA			
EXT-01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO.	M	170.86



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	8.00
EXT-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2.	PZA	40.00

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	07 DE OCTUBRE DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,901,015.98	\$152,081.28	\$2,053,097.26
2	21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$2,826,843.05	\$226,147.44	\$3,052,990.49
3	10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	\$933,843.90	\$74,707.51	\$1,008,551.41
4	06 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	\$243,727.26	\$19,498.18	\$263,225.44
5(FINIQUITO)	23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026	\$720,932.69	\$57,674.62	\$778,607.31
	TOTAL	\$6,626,362.88	\$530,109.03	\$7,156,471.91

En este acto, el LIC. RODRIGO JESSE AARON BONILLA CHINCHILLAS, Representante Legal de la empresa B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el último párrafo del Artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza No. 3355-03708-0 emitida por Aseguradora Aserta, S.A. DE C.V.,



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-REPUVE-033-2025 T-REPUVE2025-01

En vista de lo anteriormente consignado, el LIC. RODRIGO JESSE AARON BONILLA CHINCHILLAS, Representante Legal de la empresa B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., hace entrega al ING. ALBERTO IBARRA OJEDA, en su carácter de DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 hrs. del día 09 de febrero de 2026.

ENTREGA

RECIBE

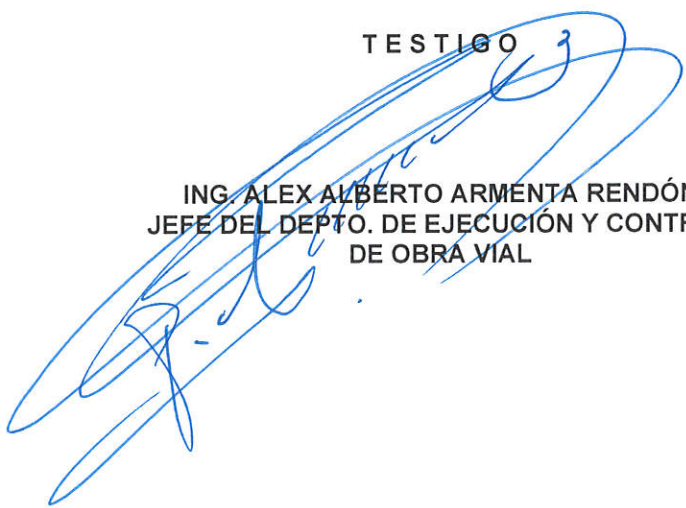
B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. RODRIGO JESSE AARON BONILLA
CHINCHILLAS
REPRESENTANTE LEGAL


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO


ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
