



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 12:00 horas del día 27 de julio de 2023, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la Entrega y Recepción Física de los Trabajos denominados:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE AV. ANTARES Y AV. DEL CASTOR, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDAS ELIGIO ESQUIVEL E ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ ENTRE C. BRAULIO MALDONADO Y C. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN FELIPE RICO ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GRAL. GILDARDO M. ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EPIGIMENIO IBARRA ENTRE AV. SÁNCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C."

Los cuales consistieron principalmente en Pavimentación, Obra Complementaria, Alcantarillado Pluvial, Recomendación de alcantarillado Sanitario, Señalamiento Vial, Señalamiento de Protección de Obra y Obra Extraordinaria, mismos que fueron ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública número LP-MXL-REPUVE-071-2022 T-REPUVE-2022-02, por CONSTRUCTORA EPYCSA S.A. DE C.V.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

- | | |
|--|--|
| 1.- Importe del contrato con I.V.A. | \$ 21,984,979.18 |
| 2.- Importe total convenido con I.V.A. | \$ 18,186,642.34 |
| 3.- Plazo de ejecución contractual | 120 (ciento veinte) días naturales |
| 4.- Fecha de inicio contractual | 16 de enero de 2023 |
| 5.- Fecha de terminación contractual | 15 de mayo de 2023 |
| 6.- Plazo de ejecución real | 136 (ciento treinta y seis) días naturales |
| 7.- Fecha de inicio real | 16 de enero de 2023 |
| 8.- Fecha de terminación real | 26 de julio de 2023 |

~~*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa*~~



II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
OB 1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AV. ANTARES Y AV. DEL CASTOR, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.		
A	PAVIMENTACION		
A 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	2,000.10
A 05	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,773.01
A 08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,818.45
B	OBRA COMPLEMENTARIA		
B 03	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 24"Ø A UNA ALTURA DE HASTA 0.80 M.	PZA	3.00
B 04	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø. DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	7.00
B 06	CONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM Y RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE VALVULA DE 4" A 12"Ø.	PZA	4.00
B 07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FOFO.	PZA	7.00
B 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PZA	4.00
C	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
C 05	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO. DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	332.44
C 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 15"Ø.	M	177.50
D	RECOMPACTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
D 05	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO. DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	135.77
D 08	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	84.87
E	SEÑALAMIENTO VIAL		
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA SIL-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICATIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	3.00
E 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD".	PZA	2.00
E 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM.	PZA	2.00
E 06	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	M	128.60
E 08	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	M	69.60
E 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA.	PZA	29.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



EXT 1	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-009	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	M2	162.86
EXT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO DE PLÁSTICO PARA MEDIDO DE AGUA POTABLE.	PZA	3.00
EXT 1.1	OBRA EXTRAORDINARIA 2		
EXT-014	CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO	M2	199.62
OB2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDAS ELIGIO ESQUIVEL E ING. RAUL SANCHEZ DIAZ ENTRE C. BRAULIO MALDONADO Y C. ABELARDO L. RODRIGUEZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.		
G	PAVIMENTACIÓN		
G 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	3.353.15
G 05	CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO	M2	3.084.75
G 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	3.084.75
H	OBRA COMPLEMENTARIA		
H 03	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 24"Ø A UNA ALTURA DE HASTA 0.80 M	PZA	6.00
H 04	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 36"Ø A UNA ALTURA DE HASTA 0.80 M	PZA	2.00
H 16	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=200 KG/CM2 CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2" - 3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	PZA	7.00
H 18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE Fofo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	7.00
I	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
I 05	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	269.34
I 06	FORMACION DE PLANTILLA 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA 3/4").	M2	171.20
I 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 15"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	147.40
I 09	RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA 3/4" (GW) HASTA 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.	M3	97.29
I 11	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	85.19
J	RECOMPACTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
J 05	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	278.40
J 08	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	174.00
L	SEÑALAMIENTO VIAL		
L 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SINØ establecidos en el "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICATIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM		1.00

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos



L 06	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	M	478.50
L 08	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	M	77.00
L 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA.	PZA	106.00
EXT 2	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-005	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 52.5 LTM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL fc=200 KG/CM2.	ML	36.50
EXT-009	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL fc=200 KG/CM2.	M2	794.98
EXT 2-2	OBRA EXTRAORDINARIA 2		
EXT-014	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO	M2	241.73
OB 3	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUAN FELIPE RICO ENTRE AV. SANCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAUL SANCHEZ DIAZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.		
N	PAVIMENTACION		
N 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	3,032.35
N 05	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,684.90
N 08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,657.19
P	OBRA COMPLEMENTARIA		
P 05	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR	PZA	3.00
P 06	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 36"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR	PZA	3.00
P 13	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 92 LTM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL fc=200 KG/CM2.	ML	604.00
P 17	CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA	PZA	5.00
Q	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
Q 05	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	24.78
Q 06	FORMACION DE PLANTILLA 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA 3/4").	M2	20.65
Q 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	29.50
Q 08	RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA 3/4" (GW) HASTA 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.	M3	9.41
Q 10	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	6.20
R	RECOMPACTACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
R 05	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD	M3	184.13
R 08	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	115.08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



S	SEÑALAMIENTO VIAL	PZA	
S 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICATIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	2.00
S 05	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	M	301.00
S 07	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	M	59.80
S 09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA.	PZA	61.00
EXT 3	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-009	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	M2	304.05
EXT-011	TAPONEO EN POZO DE VISITA ESPECIAL EXISTENTE SATURADO DE AGUA, A BASE DE PLASTICO NEGRO Y ARCILLA HASTA 1.50 M DE ALTURA DESDE NIVEL DE PLANTILLA.	PZA	1.00
EXT 3-3	OBRA EXTRAORDINARIA 2		
EXT-014	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO	M2	332.20
OB 4	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GRAL. GILDARDO M. ENTRE AV. SANCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAUL SANCHEZ DIAZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.		
U	PAVIMENTACION		
U 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	1,673.10
U 05	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,480.05
U 08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,484.25
V	OBRA COMPLEMENTARIA		
V 04	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø. DE 20 CM DE ESPESOR	PZA	3.00
V 06	CONSTRUCCION DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM Y RENIVELACION DE REGISTRO DE VALVULA DE 4" A 12"Ø	PZA	3.00
V 12	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 92 LTM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	M	335.90
V 15	CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA	PZA	3.00
W	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
W 05	EXCAVACION CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	250.60
W 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 15"Ø.	M	184.60
W 09	RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA 3/4" (GW) HASTA 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO	M3	111.95
W 11	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	40.29
X	RECOMPACTACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
X 05	EXCAVACION CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD	M3	89.15

01.

5

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



X 08	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	55.72
Y	SEÑALAMIENTO VIAL		
Y 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	2.00
Y 04	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	M	157.30
Y 06	SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	M	54.00
Y 08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA.	PZA	32.00
EXT 4	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6"Ø HASTA 6.00 M DE LONGITUD EN LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON TUBERIA DE PVC SDR-35 DE 6"Ø	PZA	3.00
EXT-008	CAMBIO DE NIVEL DE DESCARGA SANITARIA EXISTENTE POR INTERSECCION CON TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL DE PROYECTO.	PZA	2.00
EXT 4.4	OBRA EXTRAORDINARIA 2		
EXT-014	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO	M2	184.75
OB 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EPIGEMENIO IBARRA ENTRE AV. SANCHEZ TABOADA Y AV. ING. RAUL SANCHEZ DIAZ, COL. ESTRELLA, MEXICALI, B.C.		
AA	PAVIMENTACION		
AA 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	2,581.92
AA 05	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,287.19
AA 08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,308.80
AB	OBRA COMPLEMENTARIA		
AB 04	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR	PZA	7.00
AB 06	CONSTRUCCION DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM Y RENIVELACION DE REGISTRO DE VALVULA DE 4" A 12"Ø	PZA	2.00
AB 15	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=200 KG/CM2 CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 12" - 3/4" EN PROP. DE 300 GRM/3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	PZA	8.00
AB 16	CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA	PZA	8.00
AC	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
AC 05	EXCAVACION CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD	M3	613.60
AC 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 15"Ø	M	282.50
AC 09	RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA 3/4" (GW) HASTA 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO	M3	173.35



AD	RECOMPACTACIÓN DE ALcantarillado Sanitario		
AD 05	EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD	M3	177.06
AD 08	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVS.M. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR	M3	110.66
AE	SEÑALAMIENTO VIAL		
AE 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIL-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICATIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	2.00
AE 04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN" DE 10 CM DE ANCHO	M	248.90
AE 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO	M	54.80
AE 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA	PZA	49.00
EXT 5	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-009	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2	M2	642.43
EXT 5-5	OBRA EXTRAORDINARIA 2		
EXT-014	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO	M2	234.00

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	16 DE ENERO DEL 2023 AL 14 DE FEBRERO DEL 2023	\$ 1,781,349.00	\$ 142,507.92	\$ 1,923,856.92
2	15 DE FEBRERO DEL 2023 AL 16 DE MARZO DEL 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	17 DE MARZO DEL 2023 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	16 DE ABRIL DEL 2023 AL 15 DE MAYO DEL 2023	\$ 6,829,343.29	\$ 546,347.46	\$ 7,375,690.75
5	12 DE MAYO DEL 2023 AL 22 DE MAYO DEL 2023	\$ 3,866,084.96	\$ 309,286.80	\$ 4,175,371.76
6 (FINIQUITO)	23 DE MAYO DEL 2023 AL 26 DE JULIO DEL 2023	\$ 4,187,386.71	\$ 334,990.94	\$ 4,522,377.65
	TOTAL	\$ 16,664,163.96	\$ 1,333,133.12	\$ 17,997,297.08



En este acto, el Ing. German Beltrán Gómez Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V., responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas., y el último párrafo del Artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza no. 2226232 emitida por CHUBB Fianzas Monterrey, Aseguradora De Caución, S.A.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. German Beltrán Gómez Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V. hace entrega al Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 13:30 hrs. del día 27 de julio de 2023.

ENTREGA

CONTRATISTA




ING. GERMAN BELTRÁN GÓMEZ

CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

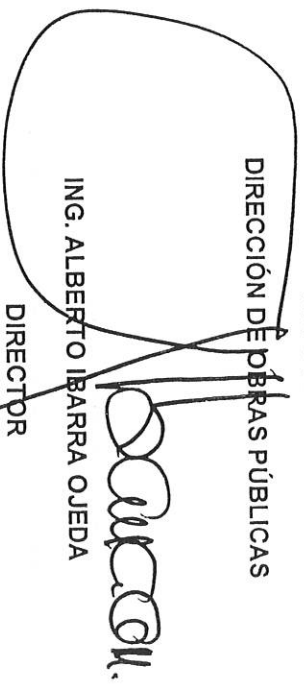

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA

DIRECTOR

TESTIGO



ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA VIAL

TESTIGO



ING. RAÚL ERNESTO LOPEZ VELASCO

RESIDENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
