



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. IS-MXL-PP-041-2024 T-PP/009/2024

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 14:00 horas del día 21 de noviembre del 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE AV. TABASCO, DE CALLE BAHÍA DE SAN LUIS GONZAGA A CALLE BAHÍA DE CALAMAJUÉ, COL. BAJA CALIFORNIA, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número **IS-MXL-PP-041-2024 T-PP/009/2024**, por **A&A CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V.**, Representada por el **Ing. Erick Hernán Beltrán Solorio**.

A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.	7.00 PZA
BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	702.66 M2
BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	148.15 M2

B PAVIMENTACIÓN

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	13,425.65 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA), CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	6,429.44 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	6,996.21 M2



C OBRA COMPLEMENTARIA

RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	11.00 PZA
RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	6.00 PZA
RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	7.00 PZA

D SEÑALAMIENTO VIAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	6.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	6.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	6.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS PESADOS" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	6.00 PZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCA.	1,503.25 M
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCA.	58.35 M
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCA.	240.45 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO	

E SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA

RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO.	70.00 PZA/SEM
RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	350 M/SEM
RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES	14.00 JORNADA



EXT OBRA EXTRAORDINARIA

FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (VOLUMEN COMPACTO). INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO EN SU PRIMER KILOMETRO. 28.34 M3

ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DEL FRESADO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MEDIDO EN SECCIÓN. 85.17 M3/KM

En este acto, el C. Erick Hernán Beltrán Solorio, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

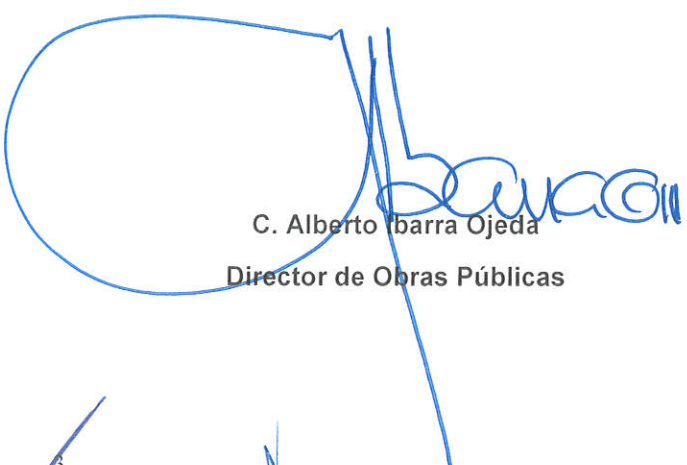
En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de A&A Construcción, S.A. de C.V., a través de su Representante Legal, el C. Erick Hernán Beltrán Solorio, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 15:00 hrs. del día 21 de noviembre del 2024 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

RECIBE


 C. Erick Hernán Beltrán Solorio
 A&A Construcción, S. A. de C.V.


 C. Alberto Ibarra Ojeda
 Director de Obras Públicas



TESTIGO

C. Alex Alberto Armenta Rendon

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO

C. Julio Rios Mora

Residente de Supervisión Obras Públicas
