



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FORTAMUN-052-2021 T-FORTAMUN/009/2021

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 10 de diciembre del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA MASCOTAS (CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL), EN LA COLONIA GRANJAS EL ENCANTO 2, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FORTAMUN-052-2021 T-FORTAMUN/009/2021 por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A-02	Excavación a máquina en material tipo a en seco de 0.00m hasta 2.00m de profundidad, en cepas de cimentación con retroexcavadora. Incluye afine de fondo y taludes dec acuerdo a especificaciones y planos de proyecto, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	419.34
B	CIMENTACIÓN		
B-04	Suministro y colocación de concreto premezclado normal F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", revenimiento de 10 cms en cimentación. incluye suministro de materiales, acarreo locales, colado, vibrado, curado, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	129.17
C	MUROS Y CASTILLOS		
C-01	Construcción de muro de block común (15 x 20 x 40 cms) de 2.45 m de altura, refuerzo vertical con varilla no. 3 @60cms (@3 celda) colado con concreto hecho en obra F'c = 150 kg/cm2, junteado con mortero cemento: arena prop. 1:4 y acabado aparente. Incluye nivelado, plomeo, armado, colado, curado, limpieza de block, suministro de material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	313.67
D	CERCO PERIMETRAL		

1



D-01	Suministro y colocación de cerco perimetral de 2.00 m de altura a base de postes de PTR de 3" x 3" x 3/16" @3.00m incluye placa de acero para soldar poste de 7" x 7" x 3/8" y placa de acero tapa de poste de 3" x 3" x 3/16", PTR de 1" x 2" cal. 18 @0.15m y PTR de 1" x 2" cal. 18 longitudinal, doble varilla no. 3 doblada (desarrollo de varila de 0.96m de long. C/u) y soldada a placa de fijación de poste y ahogada en pilote de concreto armado con 4 varillas no. 3 y estribos @0.15m a base de concreto F'c = 200 kg/cm2, suministro de materiales, cortes, soldadura, acarreo locales, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte anticorrosivo, colocación, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta construcción.	M	27.06
D-02	Suministro y colocación de puerta de acceso de 5.30m x 2.00m base de postes de PTR de 3" x 3" x 3/16" @3.00m incluye placa de acero para soldar poste de 7" x 7" x 3/8" y placa de acero tapa de poste de 3" x 3" x 3/16", PTR de 1" x 2" cal. 18 @0.15m y PTR de 1" x 2" cal. 18 longitudinal, doble varilla no. 3 doblada (desarrollo de varila de 0.96m de long. C/u) y soldada a placa de fijación de poste y ahogada en pilote de concreto armado con 4 varillas no. 3 y estribos @0.15m a base de concreto F'c = 200 kg/cm2, suministro de materiales, pasador, portacandado, cortes, soldadura, acarreo locales, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte anticorrosivo, colocación, nivelación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta construcción.	PZA	2.00

En este acto, el **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya** representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de encargado de Despacho de la **Dirección de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** a través de su representante legal, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, los trabajos anteriormente descritos.



Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 horas del día 10 de diciembre del 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL
TERRITORIO S.A. DE C.V.**

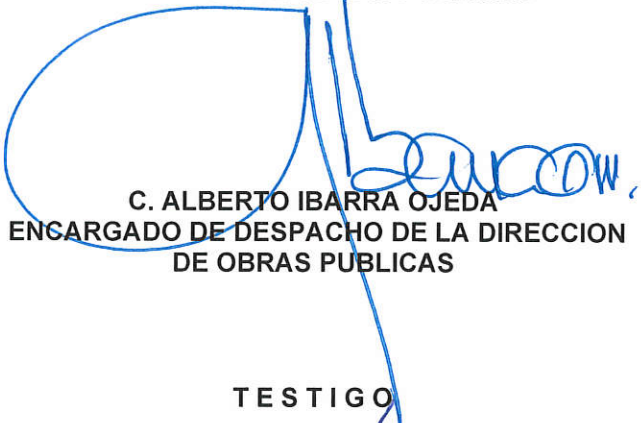

**C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO


**C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
SUPERVISOR**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**C. ALBERTO IBARRA OJEDA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS**

TESTIGO


**C. JUAN CARLOS ESTRADA VALENZUELA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**
