



**DEPENDENCIA:** Dirección de Obras Públicas Municipales  
**DEPARTAMENTO:** Ejecución y Control de Obra Vial  
**Oficio No.** DOPM-372-B-2024  
**ASUNTO:** Suspensión de obra  
**Mexicali, B.C., 04 de marzo de 2024.**

**FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R. L.**  
**C. Jesús Pacheco Raudales**  
**Representante Legal**  
**Presente. –**

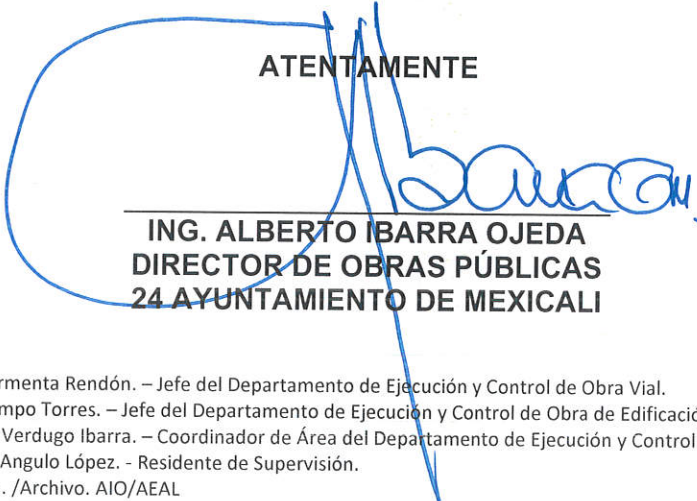
Con relación al Contrato de Obra Pública No. **LP-MXL-FAISMUN-011-2024 T-FAISMUN24-004**, referente a la obra **“CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C.”**, que de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministro y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y Artículo 60 de su Reglamento y de acuerdo al Acta Circunstanciada con fecha de 04 de marzo de 2024, por medio de la presente informo a Usted, que se suspenderán de manera temporal los trabajos contenidos en el catálogo de conceptos del contrato en mención a partir del día **05 de marzo de 2024**, debido al tiempo de entrega de las bases de concreto prefabricadas tipo rectangular-piramidal solicitadas en el catálogo de conceptos original.

Sobre el particular, se le indica que la ejecución de los trabajos objeto del contrato deberán permanecer suspendidos en su totalidad a partir de esta fecha, **05 de marzo de 2024** y que la fecha probable para la reanudación de los mismos es del día **04 de abril de 2024**, o antes si así se requiere, no obstante que, podrá concederse la ampliación de dicho plazo, en caso de que así resulte necesario.

Asimismo, se le solicita que emprenda las acciones necesarias que permitan asegurar y resguardar el área de los trabajos, así como conservar en estado optimo los trabajos ya ejecutados, sin embargo, deberá retirar todo el equipo y el personal asignado para la realización de esta obra, con excepción del personal que se requiera para resguardar los trabajos, hasta que le sea notificado por escrito la reanudación de los mismos.

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**



C.c.p. Ing. Alex Alberto Armenta Rendón. – Jefe del Departamento de Ejecución y Control de Obra Vial.  
C.c.p. Arq. Benjamín Ocampo Torres. – Jefe del Departamento de Ejecución y Control de Obra de Edificación.  
C.c.p. Ing. Cesar de Jesús Verdugo Ibarra. – Coordinador de Área del Departamento de Ejecución y Control de Obra Vial.  
C.c.p. Ing. Adán Eduardo Angulo López. - Residente de Supervisión.  
C.c.p. Expediente de Obra. /Archivo. AIO/AEAL

*Recibis*  
*Erick Cuevas*



## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en lo establecido en la Cláusula Décima Novena del Contrato de obra pública No. **LP-MXL-FAISMUN-011-2024 T-FAISMUN24-004**, para la ejecución de los trabajos de la obra **“CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C.”**, y en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y lo estipulado en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, nos constituimos en el lugar de los trabajos, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, Director de Obras Públicas, el Ing. Adán Eduardo Angulo López, Residente de la obra y el C. Jesús Pacheco Raudales, por parte de FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R.L., para llevar a cabo la verificación de los trabajos contratados, derivada de esta inspección, se establece lo siguiente:

1.- Con fecha 19 de febrero de 2024 fueron contratados los trabajos para la ejecución de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B.C.”**, con un importe contratado de: \$ 4,033,475.29 M.N. (cuatro millones treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 29/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, y un plazo de ejecución de los trabajos de 60 (sesenta) días naturales, con fecha de inicio el día 26 de febrero de 2024 y de terminación a más tardar el día 25 de abril de 2024.

2.- Que a la fecha la obra presenta un avance físico de los trabajos correspondiente al 0.50%.

3.- Con fecha 27 de febrero y con fecha 04 de marzo de 2024, mediante escritos por parte de FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R.L. a través de su Representante Legal el C. Jesús Pacheco Raudales en el cual se informa a la Dependencia que las bases de concreto prefabricadas tipo rectangular-piramidal solicitadas en el catálogo de conceptos original tienen un tiempo de entrega aproximado de un mes y para las lámparas un tiempo de entrega de tres meses, respectivamente, según le indican sus proveedores.

4.- Por lo anterior y dado que el suministro de dichas bases en mención es primordial para el inicio de los trabajos, se le indica al contratista que deberá suspender temporalmente los trabajos motivo de este contrato, debido a la solicitud antes mencionada.

5.- El periodo de suspensión temporal de actividades será a partir del 05 de marzo de 2024, con fecha probable de reanudación de los trabajos el 04 de abril de 2024.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, siendo las 16:00 Horas del día 04 de marzo de 2024, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar firman la presente los que en ella intervinieron.

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JESÚS PACHECO RAUDALES  
REPRESENTANTE LEGAL  
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R.L.

ING. ADÁN EDUARDO ANGULO LÓPEZ  
RESIDENTE DE OBRA D.O.P.



# FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.

EDIFICACIONES, TERRACERIAS, OBRAS PLUVIALES

MEXICALI, B.C. A 27 DE FEBRERO DE 2024

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL  
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

REFERENTE AL CONTRATO CON NO. LP-MXL-FAISMUN-011-2024 T-FAISMUN24-004, POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B. C." , HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO DE PARTE DE NUESTRA PROVEDORA QUE LA BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33X33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40X40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, F'C=210 KG/CM<sup>2</sup>, SOLICITADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, NOS INFORMA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE ESE SUMINISTRO POR EL MOMENTO, EL CUAL TIENE UN TIEMPO DE ESPERA APROXIMADO DE UN MES.

SIN MÁS EN PARTICULAR, Y ESPERANDO PRONTA RESPUESTA, AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED COMO SU MÁS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE  
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA  
S.C. DE R.L.



JESÚS PACHECO RAUDALES





Número de cliente      Fecha de documento  
1414572                      26/02/2024  
Número de cotización      Vendedor  
212615880                      CLAUDIA BANUELOS

## Cotización

### FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA SC DE RL

62 NO. 1967  
MEXICALI  
BC  
MX  
21389

+52 (686) 157-6675  
Página 1 de 3

- **Vigencia de la oferta:** 3 DIAS HABILES
- **Tiempo de entrega:** ESPECIFICADO EN CADA PRODUCTO
- **Lugar de entrega:** LAB CENMEX MEXICALI
- **Condiciones de pago:** CONTADO

- 1.-Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- 2.-El precio del flete está sujeto a cambios de acuerdo con el destino final.
- 3.-En caso de requerir flete, la programación será posterior a la confirmación de su pago y queda sujeta a disponibilidad de las unidades.
- 4.- Los vehículos **No** cuentan con permiso para circular en zona prohibida para ingreso de unidades de doble rodado.
- 5.-Por ningún motivo se aceptan devoluciones, cambios totales o parciales.
- 6.-Cualquier modificación no contemplada en las normas y productos, así como el número de piezas, requerirá de la revisión de los precios cotizados y del tiempo de entrega.

- LA MANIOBRA DE DESCARGA ES POR PARTE DEL CLIENTE

- NO SE INCLUYE PERMISOS PARA CIRCULAR EN ZONA PROHIBIDA PARA CAMIONES DE DOBLE RODADO

Descripción	Cantidad	UM	Precio	Importe
Base de concreto prefabricada piramidal Sup.33X33 Inf.40X40 50cm altura TIEMPO DE ENTREGA, DE 30 DIAS HABILES	107	PZA	\$3,000.00	\$321,000.00

¡Mas de 40 años nos respaldan....  
en precio, calidad y servicio!

**Subtotal:** \$321,000.00  
**IVA %:** \$25,680  
**Retención:** \$0.00  
**Total:** \$346,680.00



# FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.

EDIFICACIONES, TERRACERIAS, OBRAS PLUVIALES

MEXICALI, B.C. A 04 DE MARZO DE 2024

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL  
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

REFERENTE AL CONTRATO CON NO. LP-MXL-FAISMUN-011-2024 T-FAISMUN24-004, POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE GABRIEL LEYVA, DE CARRETERA FEDERAL NO. 2 A AV. GABINO VÁZQUEZ, EJIDO SINALOA, B. C.", HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO DE PARTE DE NUESTRA PROVEDORA QUE LA LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 135 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI MIN, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MCA. AMERICAN ELECTRIC. SOLICITADA EN CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, NOS INFORMA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE ESE SUMINISTRO POR EL MOMENTO, EL CUAL TIENE UN TIEMPO DE ESPERA DE TRES MESES, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN OTRO TIPO DE MODELO PARA PODER DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE OBRA.

SIN MÁS EN PARTICULAR, Y ESPERANDO PRONTA RESPUESTA, AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED COMO SU MÁS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE  
FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA  
S.C. DE R.L.



  
JESÚS PACHECO RAUDALES  
REPRESENTANTE LEGAL

