



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-PRON-013-2025 T-PRON25-009

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 24 de septiembre de 2025, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“PAVIMENTACIÓN DE AV. INTERNACIONAL, DE CALLE TERCERA A CALLE CUARTA,
POBLADO LOS ALGODONES, B.C.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número **IS-MXL-PRON-013-2025 T-PRON25-009**, por **NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**

Estos trabajos consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PAVIMENTACIÓN		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS DIVERSAS	M3	20.00
A 06	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	1,602.68
A 07	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA.	M2	1,528.68
A 08	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA IMPREMAX 400, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2.	M2	1,527.28
A 09	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	1,602.18
A 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	M2	1,602.18
B	OBRA COMPLEMENTARIA		
B 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	132.00
B 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	118.00
B 03	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2,	M	11.00



B 04	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM ² , ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO.	M2	321.03
C ALUMBRADO PÚBLICO			
C 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 135 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MCA. AMERICAN ELECTRIC.	PZA	5.00
C 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM ² , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	5.00
C 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR.	PZA	5.00
C 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1, CAL. 6 AAC FASES Y CAL. 6 ACSR NEUTRO.	M	142.70
C 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0-4/0 KCMIL, ACSR: 1/0-4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 CAT. YC28U26 MCA. BURNDY.	PZA	18.00
D SEÑALAMIENTO VIAL			
D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	1.00
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	3.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM Y SEÑAL DE INFORMACIÓN SIG-11 "SENTIDO DEL TRÁNSITO" DE 20x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	1.00
D 04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M ² .	M	447.52
D 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M ² .	M	53.10

2



En este acto, **C. Martín Alfredo Gámez López**, Representante Legal de la empresa **NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de **NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Martín Alfredo Gámez López** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 24 de septiembre de 2025 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

CONTRATISTA
NORBAJA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

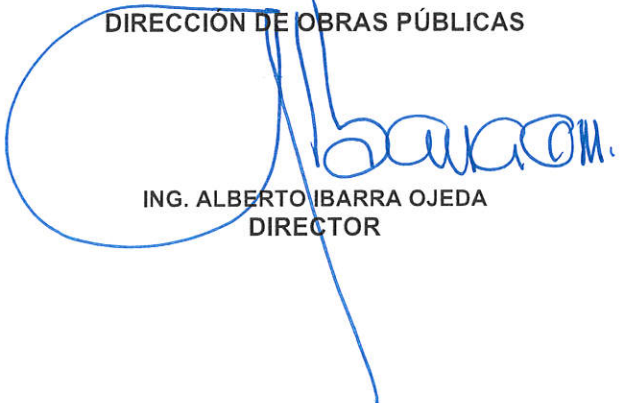

C. MARTIN ALFREDO GÁMEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


ING. LUIS RODOLFO URBANO CRUZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
