



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025

En la ciudad de Mexicali, B.C., a las 10:15 horas del día **10 de marzo de 2026**, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

OBRA: "REHABILITACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A FRACCIONAMIENTOS CERRADA DEL SOL Y VEREDAS DEL SOL, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número: **LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025**, por **CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.**,

Estos trabajos consistieron en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, PASOS A NIVEL, CUNETAS Y ESTRUCTURAS DIVERSAS.	M3	48.00
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES.	M3 KM	1,406.41
A 03	EXCAVACIÓN EN CORTE EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN PASO A NIVEL.	M3	72.22
A 04	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	M3 KM	2,116.05
A 05	RETIRO DE BOYA METÁLICA CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, RESGUARDO PARA SU REINSTALACIÓN.	PZA	22.00
A 06	RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS.	PZA	12.00
A 07	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA, MANO DE OBRA.	PZA	5.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025

A 08	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO EN USO	PZA	8.00
	DE DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: SIN INGRESO DE PERSONAL AL INTERIOR DEL POZO.		
A 09	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE , INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL, CARGA.	PZA	9.00
A 11	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO , INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR; EXCAVACIÓN EN UN ESPESOR DE HASTA 30 CM.	M2	310.50
A 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8' , INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8'.	PZA	1.00
B	PAVIMENTACIÓN		
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2 . INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA.	M2	15,400.66
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA), CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22 .	M2	7,560.08
B 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO , CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22 .	M2	7,840.58
C	PASOS PEATONALES A NIVEL		
C 01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL CORTAR . INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR.	M2	240.69
C 02	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DESPLANTE DE LOSA DE PASO PEATONAL , CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA.	M3	72.22
C 03	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO f'c=300 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, ESTAMPADO CON MOLDE TIPO ASHLAS CUT STATE + COLOR ENDURECEDOR EN POLVO "BRICK RED" + COLOR DESMOLDANTE "WALNUT" + SELLADOR MARCA DESERT BROWN LAKER SEALER.	M2	73.00
C 04	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO RANURADO.	M2	166.75
C 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DIAMANTADO DE 1/2" DE ESPESOR .	M2	6.00
D 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø , DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	PZA	8.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025

	CONCRETO $f'c=250$ KG/CM ² , CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M ³ .		
D 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø , INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA.	PZA	9.00
D 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA CON UNA REJILLA , INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO CON 3 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS 1/4" DE DIÁMETRO @15 CM, CIMBRADO.	PZA	5.00
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo , PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	8.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO , PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA.	PZA	9.00
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	5.00
D 09	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	8.00
D 10	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS.	PZA	22.00
D 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 135 W , 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN.	PZA	22.00
E	SEÑALAMIENTO VIAL		
E 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM , FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	7.00
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM , FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	1.00
E 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM , FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	6.00
E 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 61x61 CM , FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	4.00
E 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-07 "CEDA EL PASO" DE 61x61 CM , FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	1.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO No. LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025

E 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-18 "DOBLE CIRCULACIÓN" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	2.00
E 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-21 "ESTRECHAMIENTO ASIMÉTRICO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
E 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.	PZA	5.00
E 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-16 "GLORIETA" DE 61x61 CM Y SEÑAL PLACA DE DISTANCIA DE 61x20 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
E 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-42 "TOPES" DE 61x61 CM Y SEÑAL PLACA DE DISTANCIA DE 61x20 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
E 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA DE LÁMINA CAL. 10 DE 21.7x21.7x6.8 CM, ACABADO EN PINTURA POLIESTER MICROPULVERIZADA, HORNEADA, MARCA PRO-TECH MOD. TR-BM02.	PZA	120.00
E 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	1,477.90
E 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	50.10
E 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	93.40
E 15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	69.60
E 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES.	PZA	491.00
F	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA		
F 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	329.99
F 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	M/SEM	928.57
EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-01	CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA VIALIDAD DE 1.50 M DE ANCHO Y 7.0 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO.	ML	12.40



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. LP-MXL-PP-050-2025 T-PP/004/2025


En este acto, el **ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY**, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, recibe de **CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.**, través de su Representante Legal el **ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:45 hrs. del día **10 de marzo de 2026** y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA


CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.,



ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

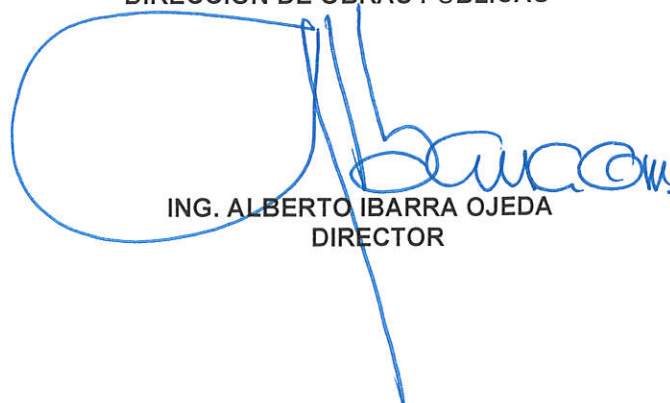

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO



ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO



ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

